Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressource
1	**EM 615 - Planung + Realisierung**	**1235 Tage**	**Do 05.10.17**	**Di 13.09.22**		
2	**Vorplanung LPH 2**	**175 Tage**	**Do 05.10.17**	**Mi 20.06.18**		
3	Beauftragung Architekt+ LA mit Vorplanung LPH 2	0 Tage	Do 05.10.17	Do 05.10.17		MRG
4	Beauftragung Fachplaner TWP, HLS, ELT abgeschlossen	0 Tage	Do 30.11.17	Do 30.11.17		MRG
5	Beauftragung Fachplaner Küche, Brandschutz, Bauphysik abgeschlossen	0 Tage	Do 11.01.18	Do 11.01.18		MRG
6	Vorplanung mit qualifizierter Kostenschätzung	101 Tage	Do 05.10.17	Mi 28.02.18	3	Architekt
7	Abgestimmte und prüffähige Unterlagen zur Vorplanung liegen vor	0 Tage	Mi 28.02.18	Mi 28.02.18	6	Architekt
8	Prüfung und Genehmigung der Vorplanung	49 Tage	Do 01.03.18	Mo 14.05.18	7	Baurefer
9	genehmigte Vorplanung liegt vor	0 Tage	Mo 14.05.18	Mo 14.05.18	8	Baurefer
10	Vorbereitung für Beschluss "Projektauftrag"	15 Tage	Di 15.05.18	Mi 06.06.18	9	RBS
11	Projektauftrag erfolgt	0 Tage	Mi 20.06.18	Mi 20.06.18	10EA+10	RBS
12	**Entwurfsplanung LPH 3**	**138 Tage**	**Do 21.06.18**	**Mi 09.01.19**		
13	Beauftragung Entwurfsplanung LPH 3	0 Tage	Do 21.06.18	Do 21.06.18	11EA+1 T	MRG
14	Entwurfsplanung	95 Tage	Fr 22.06.18	Di 06.11.18	13	Architekt
15	Abgestimmte und prüffähige Unterlagen zur Entwufsplanung liegen vor	0 Tage	Di 06.11.18	Di 06.11.18	14	Architekt
16	Vorbereitung 1.Projektüberprüfung	15 Tage	Mi 07.11.18	Di 27.11.18	15	MRG
17	1.Projektüberprüfung erfolgt	0 Tage	Mi 09.01.19	Mi 09.01.19	16EA+28	MRG
18	**Genehmigungsplanung LPH 4**	**146 Tage**	**Mi 02.01.19**	**Do 01.08.19**		
19	Beauftragung Genehmigungsplanung LPH 4 und 5	0 Tage	Fr 11.01.19	Fr 11.01.19	17EA+2 T	MRG
20	Genehmigungsplanung	25 Tage	Mi 02.01.19	Di 05.02.19	19EA-8 Ta	Architekt
21	Abgestimmte und prüffähige Unterlagen zur Genehmigungsplanung liegen vor	0 Tage	Mi 06.02.19	Mi 06.02.19	20EA+1 Tag	Architekt
22	Baugenehmigungsverfahren	120 Tage	Do 07.02.19	Do 01.08.19	21	LBK
23	Baurecht liegt vor	0 Tage	Do 01.08.19	Do 01.08.19	22	LBK
24	**Ausführungsplanung LPH 5 (Gebäude) - Rohbau, Gebäude dicht**	**185 Tage**	**Mi 02.01.19**	**Do 26.09.19**		
25	Werkplanung Rohbau Gebäude dicht -Stufe 1	60 Tage	Mi 02.01.19	Di 26.03.19	19EA-8 Ta	Architekt
26	Abstimmung Architekt mit TGA	35 Tage	Mi 27.03.19	Fr 17.05.19	25	Architekt
27	Werkplanung Rohbau, Gebäude dicht - Stufe 2	60 Tage	Mo 20.05.19	Mi 14.08.19	26	Architekt
28	Ausführungsplanung TGA	155 Tage	Mi 02.01.19	Mi 14.08.19	25AA	Planer TG
29	Ausführungsplanung Tragwerksplanung	100 Tage	Mi 20.03.19	Mi 14.08.19	25EA-5 Ta	Tragwerk
30	Prüfung Statikplanung	100 Tage	Mo 06.05.19	Do 26.09.19	29EA-70 T	Prüfer
31	Abgestimmte Werkplanung für Durchführung Vergabeverfahren 1.Teil liegt vor	0 Tage	Mi 03.07.19	Mi 03.07.19	26EA+30 Tage	Architekt
32	Abgestimmte Fachplanung für Durchführung Vergabeverfahren 1.Teil liegt vor	0 Tage	Mi 03.07.19	Mi 03.07.19	26EA+30 Tage	Planer TGA
33	Übergabephase von Architekt an Arch.-AVA	40 Tage	Di 02.04.19	Fr 31.05.19	26EA-31 T	Architekt
34	**Ausführungsplanung LPH 5 (Gebäude) - Ausbau**	**100 Tage**	**Fr 16.08.19**	**Fr 10.01.20**		
36	**Ausführungsplanung LPH 5 (Außenanlagen)**	**125 Tage**	**Mi 02.01.19**	**Mi 03.07.19**		
37	Werkplanung Außenanlagen Stufe 1	60 Tage	Mi 02.01.19	Di 26.03.19	19EA-8 Ta	LA
38	Abstimmung LA mit TGA	35 Tage	Mi 27.03.19	Fr 17.05.19	37	LA
39	Werkplanung Außenanlagen Stufe 2	29 Tage	Mo 20.05.19	Di 02.07.19	38	LA
40	Abgestimmte Werkplanung für Durchführung Vergabeverfahren 1.Teil liegt vor	0 Tage	Mi 03.07.19	Mi 03.07.19	39EA+1 Tag	LA

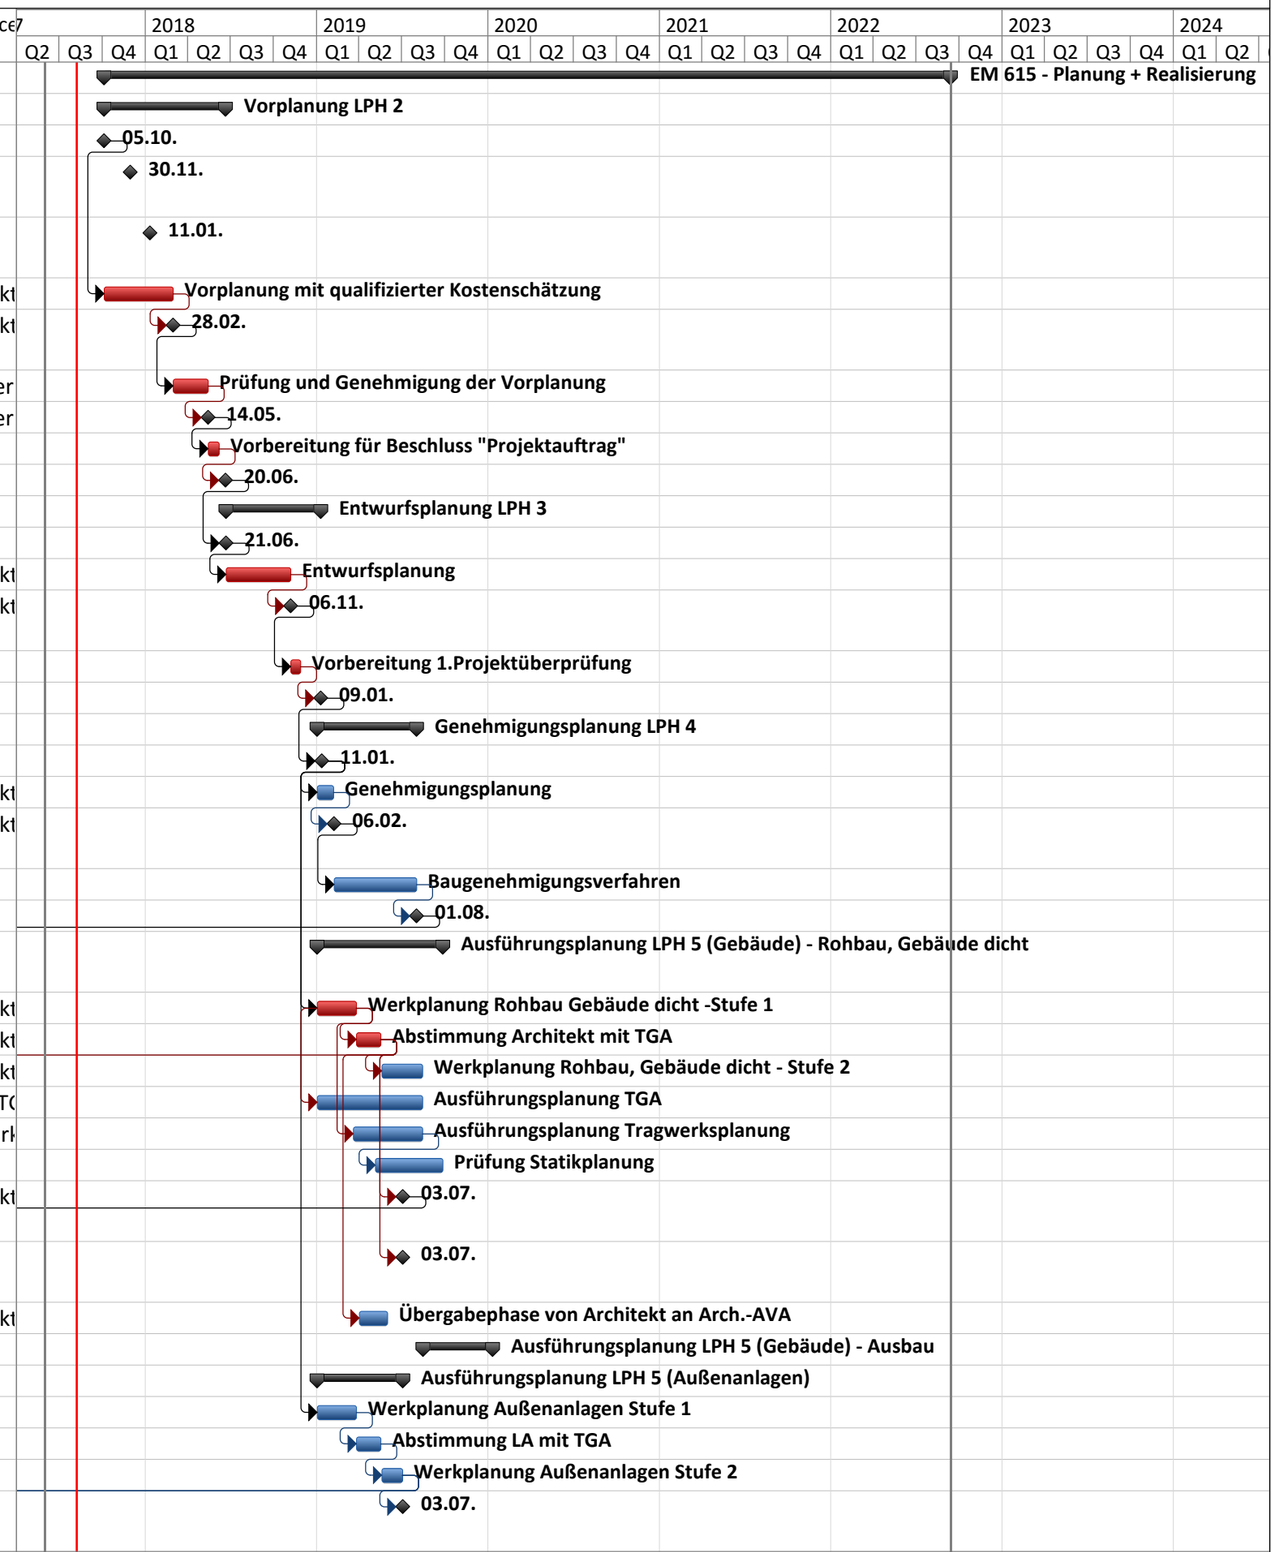
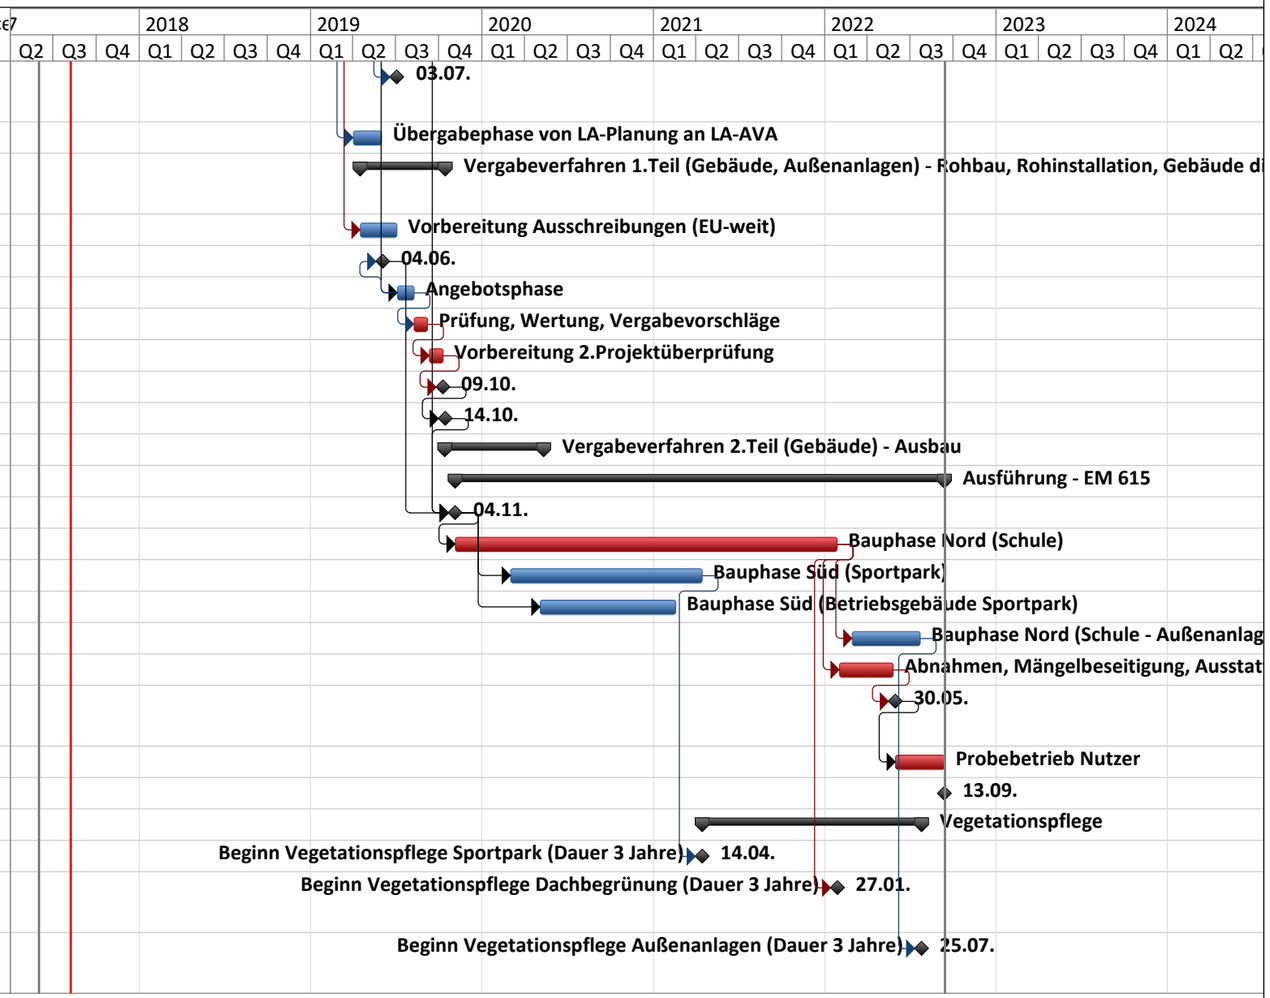
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressource
41	Abgestimmte Fachplanung für Durchführung Vergabeverfahren 1.Teil liegt vor	0 Tage	Mi 03.07.19	Mi 03.07.19	39EA+1 Tag	Planer TGA
42	Übergabephase von LA-Planung an LA-AVA	40 Tage	Di 02.04.19	Fr 31.05.19	39EA-60 T	LA
43	**Vergabeverfahren 1.Teil (Gebäude, Außenanlagen) - Rohbau, Rohinstallation, Gebäude dicht**	**121 Tage**	**Mi 17.04.19**	**Mo 14.10.19**		
44	Vorbereitung Ausschreibungen (EU-weit)	50 Tage	Mi 17.04.19	Mi 03.07.19	26EA-20 T	AVA
45	Vorzeitiger Baubeginn liegt vor	0 Tage	Di 04.06.19	Di 04.06.19	46AA-21 T	RBS
46	Angebotsphase	35 fTage	Do 04.07.19	Do 08.08.19	31EA+1 Ta	AVA
47	Prüfung, Wertung, Vergabevorschläge	20 Tage	Fr 09.08.19	Fr 06.09.19	46	AVA
48	Vorbereitung 2.Projektüberprüfung	20 Tage	Mi 11.09.19	Mi 09.10.19	47EA+2 Ta	MRG
49	2.Projektüberprüfung	0 Tage	Mi 09.10.19	Mi 09.10.19	48	MRG
50	Vergabe der Bauleistungen 1.Teil	0 Tage	Mo 14.10.19	Mo 14.10.19	49EA+3 Ta	MRG
51	**Vergabeverfahren 2.Teil (Gebäude) - Ausbau**	**143 Tage**	**Mo 14.10.19**	**Mo 11.05.20**		
59	**Ausführung - EM 615**	**717 Tage**	**Mo 04.11.19**	**Mo 12.09.22**		
60	Physischer Baubeginn	0 Tage	Mo 04.11.19	Mo 04.11.19	50EA+14 T	NN
61	Bauphase Nord (Schule)	28 Monat	Di 05.11.19	Mi 26.01.22	60	NN
62	Bauphase Süd (Sportpark)	280 Tage	Mo 02.03.20	Di 13.04.21	60EA+80 T	NN
63	Bauphase Süd (Betriebsgebäude Sportpark)	200 Tage	Mo 04.05.20	Di 16.02.21	60EA+122	
64	Bauphase Nord (Schule - Außenanlagen)	100 Tage	Mo 28.02.22	Fr 22.07.22	61EA+22 T	
65	Abnahmen, Mängelbeseitigung, Ausstattung	80 Tage	Di 01.02.22	Mi 25.05.22	61EA+3 Ta	NN
66	Fertigstellung inkl. aller Übergaben und Dokumentationen	0 Tage	Mo 30.05.22	Mo 30.05.22	65EA+2 Tage	NN
67	Probebetrieb Nutzer	72 Tage	Di 31.05.22	Mo 12.09.22	66	NN
68	**Schulbeginn (Schuljahr 2022/23)**	0 Tage	Di 13.09.22	Di 13.09.22		NN
69	**Vegetationspflege**	**322 Tage**	**Mi 14.04.21**	**Mo 25.07.22**		
70	Beginn Vegetationspflege Sportpark (Dauer 3 Jahre	0 Tage	Mi 14.04.21	Mi 14.04.21	62EA+1 Ta	NN
71	Beginn Vegetationspflege Dachbegrünung (Dauer 3 Jahre)	0 Tage	Do 27.01.22	Do 27.01.22	61EA+1 Tag	NN
72	Beginn Vegetationspflege Außenanlagen (Dauer 3 Jahre)	0 Tage	Mo 25.07.22	Mo 25.07.22	64EA+1 Tag	NN
